SYNDICAT DU BASSIN de la JOUANNE

Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 4 février 2011 à 10h00

Présents : M. Thierry ROBIN, M. Claude LANGEVIN, M. Pascal PANCHER (Suppléant de M. Daniel CLIMENT), M. Franck AMIARD (Suppléant de M. Thierry MASSOT), M. Guy DEVER, M. Roger MAROT, M. Jacques LECORNE, M. Thierry LEMEE, M. Philippe BOURDAIS, M. Jean-Bernard LE GALLIOT, M. Jacques MAIGNAN, Mme Joëlle GAUDIN et M. Didier MARQUET.

Excusés : M. Paul MASSEROT, M. Robert GESLOT, M. Claude GEORGET, M. Louis BONNEAU, M. Jean-Marc HALLE, Mme Annette CHESNEL.

Assistaient également à la réunion :
- M. Nicolas BOILEAU : Techniciens de rivière des Syndicats
- M. Yohann LUCAS : Responsable technique des Syndicats

.....

Travaux CRE 2011 et demande de subventions

M. Le Président laisse la parole à Nicolas BOILEAU pour la présentation des travaux CRE pour l'année 2011.
- Débroussaillage et embâcles : Le linéaire concerné va de ST CENERE au site de Pochard à BONCHAMP. L'enveloppe est importante car le linéaire est assez long, et il y a beaucoup d'abattage à prévoir.
- Abreuvoirs : Les aménagements d'abreuvoir sont prévus sur le même linéaire que le débroussaillage.
- Restauration de la continuité

Les ouvrages concernés pour 2011 sont :
> Souffrette à FORCE
> La Place à ARGENTRE
> Le bourg à ST CENERE
> La Valette à ST CENERE
> Pochard à BONCHAMP
> La Grande Courbe à BREE
> La Voisinière à EVRON
+ Travaux complémentaires à NEAU

- Suivi des indicateurs
- Communication : Edition de la plaquette d'information sur le CRE.

Le programme CRE pour 2011 pourrait s'établir de la manière suivante :

Enlèvement d'embâcles *(De ST CENERE au site de Pochard à BONCHAMP)*	= 6 000 €
Débroussaillage *(De ST CENERE au site de Pochard à BONCHAMP)*	= 81 500 €
Abreuvoirs	= 36 000 €
Restauration de la continuité	= 100 000 €
Suivi IBGN	= 4 200 €
Communication	= 3 000 €
TOTAL 2011	**= 230 700 €**

Après en avoir délibéré, LE COMITE SYNDICAL DECIDE :
- De solliciter la subvention auprès de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et du Département pour l'année 2011, ainsi qu'auprès du Conseil Régional par le biais du CRBV,
- D'autoriser le Président à signer tout document lié à ce dossier.

M. Le Président précise que pour les concertations, des rencontres sont organisées avec les conseils municipaux de la commune et les riverains concernés afin d'expliquer les projets prévus sur la commune.

Nicolas BOILEAU indique que dorénavant, les chiffrages utilisés pour les demandes de subvention devront être plus près de la réalité, les financeurs ont souhaité que les chiffrages du bureau d'études ne soient plus utilisés au vu des grosses différences avec le prix réel des travaux réalisés.

M. le Président demande à Nicolas BOILEAU de présenter brièvement les 3 scénarios proposés par le bureau d'études et retenus par le comité de pilotage de l'étude relative à l'aménagement de la Jouanne dans MONTSURS afin de connaître l'avis des membres du comité syndical. Il précise également que ces 3 propositions seront présentées aux habitants de MONTSURS en réunion publique le Jeudi 17 mars prochain à 20h (Salle des Oréades).

Autorisation donnée au Président pour la signature des conventions de mandats

Parmi les travaux réalisés dans le cadre du Contrat Restauration Entretien (CRE), l'aménagement d'abreuvoirs et d'ouvrages (type seuils, ...) nécessite la signature avec les propriétaires riverains (et les exploitants pour les abreuvoirs) de conventions de mandat. Ces conventions ont pour but d'autoriser le Syndicat à entreprendre des travaux de restauration et d'entretien, d'aménagement d'abreuvoirs, sur la propriété du bénéficiaire.

Les travaux réalisés seront ensuite transférés au propriétaire du site, qui s'engage à assurer le maintien en bon état des aménagements réalisés.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité :
- Autorise le Président à signer ces conventions de mandat et leurs avenants, jusqu'au 31/12/2011.

Subvention 2011 pour la FDGDON

Comme tous les ans, le Syndicat est sollicité par la FDGDON pour une subvention. M. le Président présente aux délégués l'historique des versements effectués en faveur de la FDGDON depuis 10 ans.

2001 - Achat carottes (2 703 kg x 1,14 €)..... = 3 090,52 €	16 030,84 €
2002 - Achat carottes (3 264 kg x 1,15 €)..... = 3 753,60 €	
2003 - Achat carottes (3 036 kg x 1,20 €)..... = 3 643,20 €	
2004 - Achat carottes (1 926 kg x 1,22 €)..... = 2 349,72 €	
2005 - Achat carottes (1 878 kg x 1,25 €) ..... = 3 193,80 €	
2006 - Subvention points de contrôle..... = 650,00 €	3 414,00 €
2007 - Subvention points de contrôle ..... = 664,00 €	
2008 - Subvention points de contrôle ..... = 680,00 €	
2009 - Subvention points de contrôle ..... = 700,00 €	
2010 - Subvention points de contrôle ..... = 720,00 €	
+ 2010 - Subvention exceptionnelle ..... = 2 057,00 €	

M. Le Président indique qu'il souhaite que la lutte menée par les bénévoles continue, c'est aujourd'hui le meilleur moyen d'agir sur la population de nuisibles.
Il informe les délégués que la FDGDON a procédé à une analyse plus précise pour le calcul de la demande de subvention auprès des Syndicats de Bassins.
Désormais le coût réel des activités de la FDGDON 53 sur le territoire du Syndicat sera pris en compte :
- Primes et Frais Activités Rongeurs aquatiques nuisibles = 467 €
- Animations de réunions = 525 €
- Points de contrôle (BREE et BONCHAMP) : 740 €

Pour l'année 2011, la FDGDON sollicite donc le Syndicat à hauteur de **1 732 €.**

Considérant qu'il est nécessaire de continuer la lutte contre la prolifération des ragondins, *et après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité*, décide d'octroyer une subvention de **1 732 €** à la FDGDON pour l'année 2011.

Débat d'orientation budgétaire 2011

Résultats provisoires 2010

Section de Fonctionnement

Chapitre	DEPENSES	CA 2009	BUDGET 2010	CA 2010 (provisoire)
11	Charges à caractère général	57 005,06	134 145,00	**84 711,70**
12	Charges de personnel	9 226,47	11 000,00	**8 199,96**
14	Atténuation de produits	165,00	200,00	**0,00**
65	Autres charges de gestion courante	45 674,92	65 427,00	**64 562,40**
66	Charges financières	810,37	507,49	**317,97**
67	Charges exceptionnelles		400,00	**0,00**
68	Amortissements et provisions	6 823,84	6 823,84	**6 823,84**
22	Dépenses imprévues		5 000,00	
23	Virement à section investissement		51 828,57	
	TOTAL	**119 705,66**	**275 331,90**	**164 615,87**

Chapitre	RECETTES			
73	Impôts et taxes	147 530,00	145 855,00	**147 019,00**
74	Contribution communes	6 597,00	6 635,00	**6 635,00**
	Subventions	482,00	119 500,00	**56 182,68**
	TOTAL	**154 609,00**	**271 990,00**	**209 836,68**

RECETTES-DEPENSES	**+ 45 220,81**

Section d'Investissement

Chapitre	DEPENSES	CA 2009	BUDGET 2010	CA 2010 (provisoire)
020	Dépenses Imprévues		5 000,00	
001	Résultat investissement reporté		25 312,72	
16	Emprunts (rembt cap.)	11 859,15	8 400,00	**8 278,41**
204	Subventions d'équipements		1 100,00	
23	Opérations d'équipement	99 170,62	485 671,83	**77 376,51**
	Opération 42 - Travaux divers	*14 177,26*	*15 000,00*	***6 516,93***
	Opération 43 - CRE	*50 072,26*	*246 671,83*	***25 872,04***
	Cpte de tiers - Abreuvoirs et ouvrages	*34 921,10*	*224 000,00*	***44 987,54***
041	Opérations patrimoniales		143 325,60	128 345,02
	TOTAL	**111 029,77**	**668 810,15**	**213 999,94**

Chapitre	RECETTES			
1068	Excédents de Fonctionnt Capitalisés	25 070,58	25 312,72	**25 312,72**
021	Prélèvement fonctionnement 2009		51 828,57	
10	FCTVA	3 856,00	6 500,00	**6 447,00**
13	Subventions			
	Agence de l'Eau	37 014,90	*162 719,42*	***5 065,00***
	Région	10 261,31	*39 000,00*	
	Départements	12 861,00	*53 500,00*	
	Communes	8 000,00		
4582	Subventions (abreuvoirs, ouvrages)		179 800,00	27 333,71
28...	Amortissements	6 823,84	6 823,84	6 823,84
041	Opérations patrimoniales		143 325,60	128 345,02
	TOTAL	**103 887,63**	**668 810,15**	**199 327,29**

RECETTES -DEPENSES	**- 14 672,65**

Opérations d'investissement

Opération n°42 = Programme hors CRE

Désignation	Prévu	Réalisé	Reste à réaliser
Enrochement et consolidation - Veinard à MONTSURS	15 000,00	4 287,66	0,00
Installation d'une pompe d'alimentation à NEAU		2 229,27	0,00
TOTAL	**15 000,00**	**6 516,93**	**0,00**

Opération n°43 = CRE

Désignation	Prévu	Réalisé	Reste à réaliser
Etude Aménagement Jouanne à MONTSURS	80 000,00	19 969,78	48 322,00
Intervention sur les ouvrages	166 671,83	5 902,26	24 106,00
Abreuvoirs	224 000,00	16 373,24	0,00
Ouvrages		28 614,30	0,00
TOTAL	**470 671,83**	**70 859,58**	**72 428,00**

Etat de la dette

Année	Dette en capital au 1er janvier de l'exercice	Échéances à payer au cours de l'exercice	Dont	
			Intérêts	Capital
2010	11 904,53	8 816,87	524,34	8 292,53
2011	**3 612,00**	**3 715,66**	**103,66**	**3 612,00**
		12 532,53	**628,00**	**11 904,53**

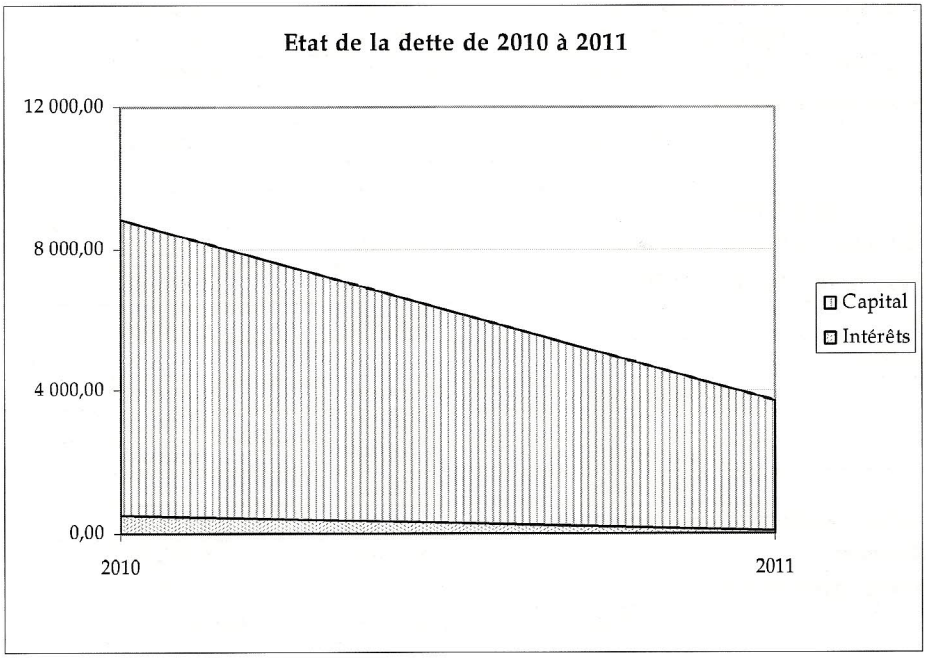

Programme 2011

> Poursuite des travaux 2010 non réalisés

Section Fonctionnement
TRAVAUX CRE

- Dépenses
  - Fin du Débroussaillage réalisé par l'entreprise DERVENN - Solde ..... 538 €
- Recettes
  - Subventions AELB, CG53 et Région pour Débroussaillage ..... 34 900 €

Section Investissement
TRAVAUX CRE

- Dépenses
  - Intervention sur les ouvrages (Restauration continuité) - Reste à réaliser ..... 24 106 €
  - Etude sur l'aménagement de la Jouanne dans MONTSURS - RAR ..... 48 322 €
- Recettes
  - Subventions AELB, CG53 et Région pour la restauration de la continuité ..... 49 400 €
  - Subventions AELB, CG53 et Région pour l'étude sur l'aménagement de la Jouanne ..... 54 600 €

> Programmation des travaux 2011

Section Fonctionnement
DIVERS

- Dépenses
  - Annonces et insertion (Travaux, Enquête publique, ...) ..... 2 800 €
  - Frais de personnel extérieur ..... 40 000 €
  - Travaux hors CRE (nettoyage, ...) ..... 5 000 €

TRAVAUX CRE

↳ Dépenses

- Débroussaillage *(De ST CENERE au site de Pochard à BONCHAMP)* ..... 81 500 €
- Enlèvement d'embâcles *(De ST CENERE au site de Pochard à BONCHAMP)* ..... 6 000 €
- Suivi des indicateurs à Argentré et Pêche électrique à Evron ..... 4 200 €
- Communication (Edition des plaquettes d'information CRE) ..... 3 000 €

↳ Recettes

- Subventions Débroussaillage ..... 65 100 €
- Subventions Embâcles ..... 4 800 €
- Subventions Suivi indicateurs ..... 3 360 €

Section Investissement
TRAVAUX CRE

↳ Dépenses

- Intervention sur les ouvrages (Restauration continuité) ..... 100 000 €
  - ↳ *Souffrette à FORCE*
  - ↳ *La Place à ARGENTRE*
  - ↳ *Le Bourg à ST CENERE*
  - ↳ *Pochard à BONCHAMP*
  - ↳ *La Valette à ST CENERE*
  - ↳ *La Grande Courbe à BREE*
  - ↳ *La Voisinière à EVRON*

  + Travaux complémentaires à la restauration à NEAU
- Abreuvoirs et clôtures *(De ST CENERE au site de Pochard à BONCHAMP)* ..... 36 000 €

↳ Recettes

- Subventions Intervention ouvrages ..... 80 000 €
- Subventions Abreuvoirs et clôtures ..... 28 800 €

DIVERS

↳ Dépenses

- Subvention d'équipement pour matériel Techniciens ..... 1 500 €
  - ↳ *Licence SIG, Ordinateur pour SIG, Outillage, ...*
- Travaux Hors CRE (enrochement, ...) ..... 5 000 €

Le Comité syndical :

- Prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire,
- Donne un avis favorable au rapport de présentation.

Questions diverses

- *Propriété des ouvrages et des aménagements réalisés*

M. Le Président souhaite interroger les délégués sur la propriété des aménagements réalisés par le Syndicat dans le cadre du CRE. Une réflexion importante est à mener afin de ne pas se poser les mêmes questions qu'actuellement sur la propriété des ouvrages.
Suite à notre rencontre avec le Trésorier, il faudra dorénavant indiquer clairement dans chaque convention signée avec les propriétaires, à qui appartiendra le seuil, ... mais également qui est chargé de l'entretien.

Cette réflexion nous amènera sans doute à réviser les statuts du Syndicat.

La prochaine réunion du Comité Syndical aura lieu le Vendredi 25 mars 2011 à 10h.

Le secrétaire de séance
Guy DEVER

Le Président
Roger MAROT
